

# 米子城跡保存・整備事業の進捗状況について

文化振興課

## 米子城跡整備基本計画策定以降の整備状況 (平成30年度策定)

### 平成30年度事業

- ・米子城跡整備基本計画策定
- ・米子城跡危険木伐採業務(登城路) ①

### 平成31年度(令和元年度)

- ・米子城跡危険木伐採業務(国道9号線側ハピネ付近) ②

### 令和2年度

- ・湊山球場用途廃止(レフトスタンド・スコアボード撤去) ③
- ・米子城跡危険木伐採業務(天守台廻り・二の丸) ④
- ・枳形石垣カルテ作成業務
- ・米子城跡三の丸駐車場整備工事 ⑤
- ・赤色立体図作成(航空測量)
- ・三の丸史跡追加指定(令和3年2月予定)

## 令和3年度以降の整備計画 (令和3年2月時点)

### 令和3年度


- ・内野スタンド、ライトスタンド撤去
- ・史跡追加指定地公有地化
- ・園路整備設計業務
- ・サイン類整備ルール策定
- ・枳形石垣修繕実施設計業務
- ・二の丸石垣カルテ作成
- ・危険木伐採業務(天守台廻り・二の丸)

### 令和4年度

- ・園路整備工事
- ・三の丸広場整備工事実施設計業務
- ・危険木伐採業務(天守廻り)
- ・枳形石垣修繕工事(積み直し等)

### 令和5年度

- ・三の丸広場整備工事(令和6年度供用開始予定)
- ・危険木伐採業務
- ・枳形石垣修繕工事(積み直し等)

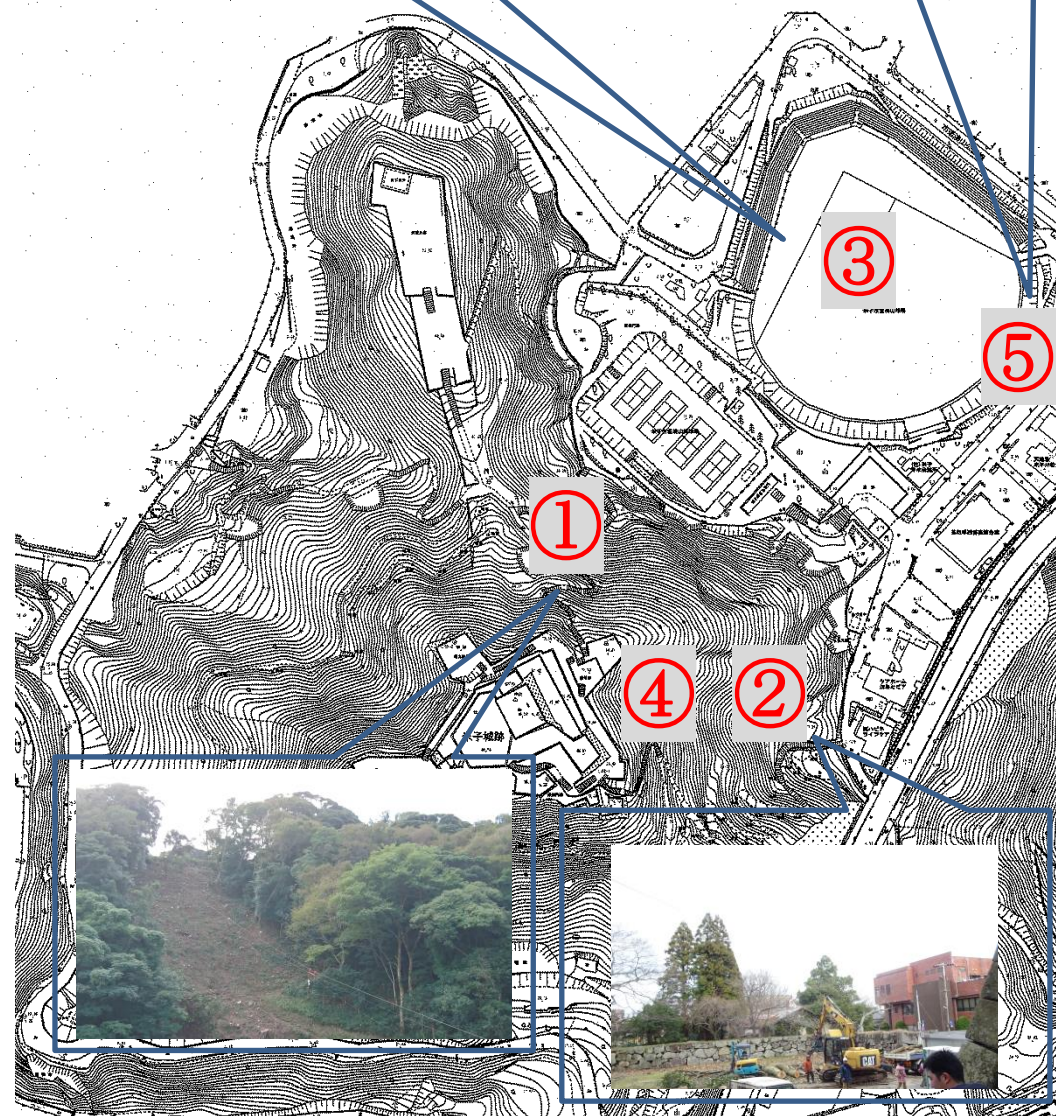

米子城跡整備イメージ図



米子城跡活用イメージ図

## 米子城魅せる！プロジェクトによるソフト事業の実施

- ・米子城跡ライトアップ  
(H30年2回 夏・秋)  
(H31年3回 春・夏・秋)  
(R2年4回 春・夏・秋・冬)



- ・城山(城下町)を活用したウォークイベント  
H30年6回(山の日記念全国大会エクスカージョン含む)  
H31年5回、R2年5回



- ・米子城フェスタ  
H30年~R2年 各1回



- ・米子城シンポジウム(H30年)
- ・ありがとう湊山球場メモリアルゲーム(R2年)
- ・石垣ナイトシアター(R2年)

