

入 札 説 明 書

市が行う建設工事の工事希望型指名競争入札を下記のとおり行いますから、希望があれば米子市建設工事執行規則(平成17年米子市規則第106号)及び米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)を承知のうえ参加してください。

記

工事希望型指名競争入札に付する工事	工 事 名	市道日原2号線1号橋ほか1橋りょう補修工事					
	工 事 場 所	米子市日原、八幡地内ほか	工 期	契 約 日 か ら 令和4年12月23日まで			
契 約 条 項 を 示 す 場 所	米子市総務部契約検査課						
担 当 課	道路整備課						
入 札 保 証 金 に 関 す る 事 項	入 札 保 証 金 免 除						
現 場 説 明 会	なし						
開 札 の 日 時 及 び 場 所	日 時	令和4年8月23日 午前10時10分	開 札	場 所 本庁舎202会議室			
契 約 保 証 に 関 す る 事 項	<p>請負代金の額が130万円を超える工事については、契約の締結と同時に請負代金額の10分の1以上の額を保証する次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。</p> <p>(1) 契約保証金の納付 (2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 銀行若しくは市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) 公共工事履行保証証券による保証 (5) 履行保証保険契約の締結</p>						
前 払 金	有	40%以内 ※ただし、請負代金の額が130万円を超える場合に限る					
部 分 払	有	回数は、米子市建設工事執行規則による ※部分払いに替えて中間前払の選択も可					
入 札 に 関 す る 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 開札前天災地変等のやむを得ない事由が生じたとき、又は競争の意思がないと認められるときは、入札の執行を中止し、又は取り止めがある。 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び米子市郵便入札実施要領第4条に定める入札は、無効とする。 入札者は、到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。 入札者は、入札書到達後においても入札執行の完了までは入札の参加を辞退することができる。 落札となるべき価格と同一価格の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。この場合において、くじを引くべき入札者が、当該入札の立会者として参加している場合はその者が、参加していない場合は入札事務に関与しない職員に当該入札者に代わってくじを引かせるものとする。 本件工事は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に定める方法により、予定価格の2/3(ただし、8/10を下回る場合は、8/10とする。)以上で最低制限価格を設定しており、最低制限価格を下回る価格で入札があつた場合は、当該入札者を失格とし、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 入札書に工事費内訳書が同封されていない場合は、無効とする 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格(円未満切捨て(単価契約を除く。))とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 入札回数は、1回とする。 						
そ の 他 の 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 米子市工事希望型指名競争入札実施要領に定める経営内容等が不健全な申込者及び工事成績が不良な申込者は、不指名とすることがある。また、同一入札における資本的、人的関係にある複数の申込者のうち1者のみを指名し、他の者を不指名とすることがある。 申込時に届けのあった配置予定技術者の変更は、入札書差出期限まで変更可能とし、その後の変更は原則として認めないものとする。 同一の主任技術者は、米子市が発注した工事(通常型指名競争入札及び随意契約によるものを除く。)に3件を超えて従事することはできないものとする。 別に定める「建設工事に係る配置予定技術者の取扱いについて」における重複申込者に該当する者は、配置予定技術者重複届出書を所定の方法により提出すること。なお、入札結果により配置予定技術者がいなくなつた場合は、失格とする。 工事現場に配置する技術者等(主任技術者、監理技術者及び現場代理人をいう。)は、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在するこをいう。)が申込日までに3ヶ月以上ある者に限るものとする。 						
施工に 関する 注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 工事設計図書 別紙のとおり 本工事の施工にあたっては、鳥取県制定「土木工事共通仕様書」、「土木工事施工管理基準」、「公共建築工事標準仕様書」又はその他別に定める仕様書等に基づき実施しなければならない。 この契約に係る工事の施工にあたっては、ダンプカー協会加入車を優先的に使用するよう努めること。 工事着手前に自治会長及び地元関係者に連絡すること。 						
米子市建設工事執行規則第14条により公にする予定価格		¥3,603,600					
最 低 制 限 価 格		(直接工事費+共通仮設費+現場管理費の9/10+一般管理費5.5/10)×1.1					

工事設計書

令和3年度	工事名	市道日原2号線1号橋ほか1橋りょう補修工事																
		部長	課長	担当課長補佐	審査	設計												
設計金額	円																	
工期	契約日から令和4年12月23日まで																	
工事場所	米子市日原、八幡地内ほか																	
工事概要	<p>市道日原2号線1号橋 橋長L=2.0m 幅員W=4.0m</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>橋梁補修工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>一式</td></tr> </table> <p>市道新庄八幡1号線1号橋 橋長L=2.3m 幅員W=7.9m</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>橋梁補修工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>構造物撤去工</td><td>一式</td></tr> <tr><td>仮設工</td><td>一式</td></tr> </table>	橋梁補修工	一式	構造物撤去工	一式	仮設工	一式	橋梁補修工	一式	構造物撤去工	一式	仮設工	一式					
橋梁補修工	一式																	
構造物撤去工	一式																	
仮設工	一式																	
橋梁補修工	一式																	
構造物撤去工	一式																	
仮設工	一式																	

米子市

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書

1 目的・主旨

本特記仕様書は、工事及び業務（以下「工事等」という。）における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要な事項を定めたものである。受注者は本特記仕様書に従って感染拡大防止に取り組むとともに、感染者等が確認された場合には発注者に速やかに報告するなど、感染拡大防止に向けて適切に対応すること。なお、感染状況の変化等により感染拡大防止対策の変更を指示する場合がある。

2 感染拡大防止に向けた取組

（1）現場等における感染拡大防止対策

次の感染拡大防止対策を徹底すること。

- ① 工事の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い、うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、発熱症状がみられる者の休暇の取得など、すべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
- ② 元請事業者をはじめ、下請事業者や技能者など、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動をとること。特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所などにおける各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所などでの食事・休憩等、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、感染防止対策に取り組むこと。また、別紙の「3つの密を避けるための手引き」を全ての作業従事者に周知するとともに、現場事務所等で掲示（掲示は工事のみ）を行い、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期すこと。
- ③ 作業従事者（下請事業者含む）が、鳥取県の指定する感染流行厳重警戒地域（IV）、感染流行警戒地域（III）、緊急事態措置区域及び、まん延防止等重点措置区域から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する前の7日間はやむを得ない場合を除き外出を自粛し、その後にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。また、感染注意地域（II）から新たに転入（通勤者を除く）する場合は、転入する直前にPCR検査を実施し陰性であることを確認した上で、その結果を事前に監督員等に報告し転入すること。外出自粛中の行動履歴及びPCR検査の結果については、確認することのできる書類を転入前に監督員等に提出すること。この対策に要する費用については、感染防止対策に係る経費として設計変更の対象とするため、事前に監督員等に協議すること。

（2）県外製作工場での監督員等の立会に検査（出来形・品質）

県外の製作工場における監督員等の立会による検査は行わないこととする。なお、受注者は自主検査を行い、検査結果を監督員に提出し、監督員は書面で検査結果の確認を行うこととする。

（3）工事等の書類の提出及び受発注者間の打合せ

書類の提出及び受発注者間の打合せは次のとおりとする。

① 書類の提出について

ア　書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任（変更）通知書、主任技術者等（変更）選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ　押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 発注者又は受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、事前に監督員等と協議を行うこと。

② 受発注者間の打合せ

ア 打合せは、事前に電子メールなどにより打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。

- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に出席した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

3 感染拡大防止対策に係る経費の設計変更

追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合には、実施内容について発注者と協議を行い、必要と認められる対策については、変更施工計画書（又は変更業務計画書）を提出すること。なお必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

4 感染等が確認された場合の対応

新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合には、別紙1及び別紙2により対応すること。

5 新型コロナウイルス感染症に係る工事等の一時中止措置等について

新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合のほか、受注者から一時中止や工期又は履行期間の延長（以下「一時中止等」という。）の申出があった場合においては、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、地方公共団体からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、工期の見直し及びこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行う。

6 下請負人への配慮及び元請負人と下請負人との間の取引の適正化

下請契約においても、工期の見直しや一時中止の措置等を適切に講じるとともに、請負代金の設定及び適切な代金の支払など、元請負人と下請負人との間の取引の適正化のより一層の徹底に努めること。

**新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた
工事及び業務の対応について**

1 工事及び業務（以下「工事等」という。）で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応（以下「当対応」という。）（別紙2参照）

（1） 対象者

発注者：監督員、調査職員（以下「監督員等」という。）を対象とする。

受注者：現場で直接作業する作業従事者（現場代理人、主任技術者、監理技術者、担当技術者、

作業員（下請含む）及び業務で配置される全ての配置技術者）（以下「作業従事者」という。）を対象とする。（社内の事務員、他現場の作業従事者は、接触者、濃厚接触者に該当する場合であっても当対応の対象外）

（2） 用語の定義

現場等：作業場、事業所等をいう。工事においては工事現場、現場事務所及び休憩所、業務については執務を行っている事務所をいう。

陽性者：PCR検査により、新型コロナウイルス感染症の感染が確認された者

濃厚接触者：保健所が濃厚接触者に該当すると判断した者

接触者：PCR検査で陽性が判明した当該現場等作業従事者と、陽性が判明した日から遡って一週間以内に会話をした者

感染の疑いがある者：濃厚接触者、接触者及び咳や発熱等、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状を呈している者

（3） 感染の疑いがある者が確認された場合の対応

ア 感染の疑いがある者が受注者側の作業従事者に確認された場合

別紙2 「[1] 該当者が受注者側の作業従事者の場合」により対応。

イ 感染の疑いがある者が発注者側の監督員等に確認された場合

別紙2 「[2] 該当者が発注者側の監督員等の場合」により対応。

（4） 注意事項

ア 陽性者について

陽性者は、保健所、医療機関等の指導に従う。

陽性者の現場作業への復帰時期についても医療機関等の判断に従う。

イ 濃厚接触者について

濃厚接触者は、保健所の指導に従う。

濃厚接触者の健康観察期間（待機期間）は最終曝露日（陽性者との接触等）から7日間とする。

ただし、道路の除雪業務に従事する者は社会機能維持者として、下記をすべて満たす場合に限り、受注者判断により濃厚接触者の健康観察期間（待機期間）の短縮を行うことができる。

①当該濃厚接触者が無症状であること

②最終曝露日から5日目にPCR検査若しくは抗原定量検査、又は4日目と5日目に抗原定性検査を行い、陰性を確認

③待機解除後に業務従事する際は、感染対策を徹底し、10日目までは当該業務以外の不要不急の外出は極力控え、公共交通機関の利用を避けすること。

※待機期間短縮に係る詳細については、「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の待機期間等について」(<https://www.pref.tottori.lg.jp/302385.htm>)を参照すること。

ウ 接触者について

接触者に該当するか否かは受発注者がそれぞれ判断する。

パーテーションの使用、マスク着用の有無を問わず、現場等において、陽性が判明した日から遡って一週間以内に陽性者と会話した者は接触者となる。

接触者はPCR検査で陰性が確認されるまで自宅待機(在宅勤務)とする。

エ (3)アにおける、「現場等の安全が確保されたか」について

工事等の一時中止を解除するにあたり、保健所の指導に従い、機械設備、現場等の消毒作業を実施する。特に保健所から指導が無い場合、消毒完了をもって安全が確保されたとみなす。

オ (3)イにおける、「工事等の一時中止の要否を検討」について

現場等の作業継続が可能な場合、監督員等の追加・変更(通知)や段階確認の臨場を机上とする(指示)等、現場等が継続できるよう監督員体制等の確保に努める。

2 工事等の書類の提出及び打合せについて

(1)工事等の書類の提出

ア 書面による指示、承諾、協議、提出、提示、報告及び通知は、やむを得ない場合及び契約関係書類を除き電子メールにより提出することとする。

※契約関係書類：契約書、現場代理人選任(変更)通知書、主任技術者等(変更)選任通知書、工程表、完成通知書、請求書、工事出来形部分等確認願

イ 押印書類は押印後にスキャンし、PDFに電子化したうえで電子メールにより送付する。

受理、承諾等の押印後は、押印後の書類を電子化し相手方に電子メールにより送付する。

ウ 受注者の環境、添付書類が多く電子化することが困難な書類など、電子メールによる送付が困難な場合は、事前に監督員等と協議を行うこと。

(2)受発注者間の打合せ


ア 打合せは、事前に電子メール等により打合せに必要な書類を提出したうえで、WEB会議システム、電話、情報共有システム等を活用し、やむを得ない場合、現場立会を除き、対面による打合せは行わないこととする。

イ やむを得ず対面による打合せを行う場合、現場立会を行う場合は、以下の点に留意すること。


- ・①密閉空間、②密集場所、③密接場面の3つの条件を避けること。
- ・最小限の人数で実施するよう双方で働きかけを行う。
- ・マスク着用を推奨する等、感染予防を徹底する。
- ・打合せ等に出席した全員の氏名を受発注者双方で記録すること。

工事等で新型コロナウイルス感染症の感染等が確認された場合の対応


[1] 該当者が受注者側の作業従事者の場合

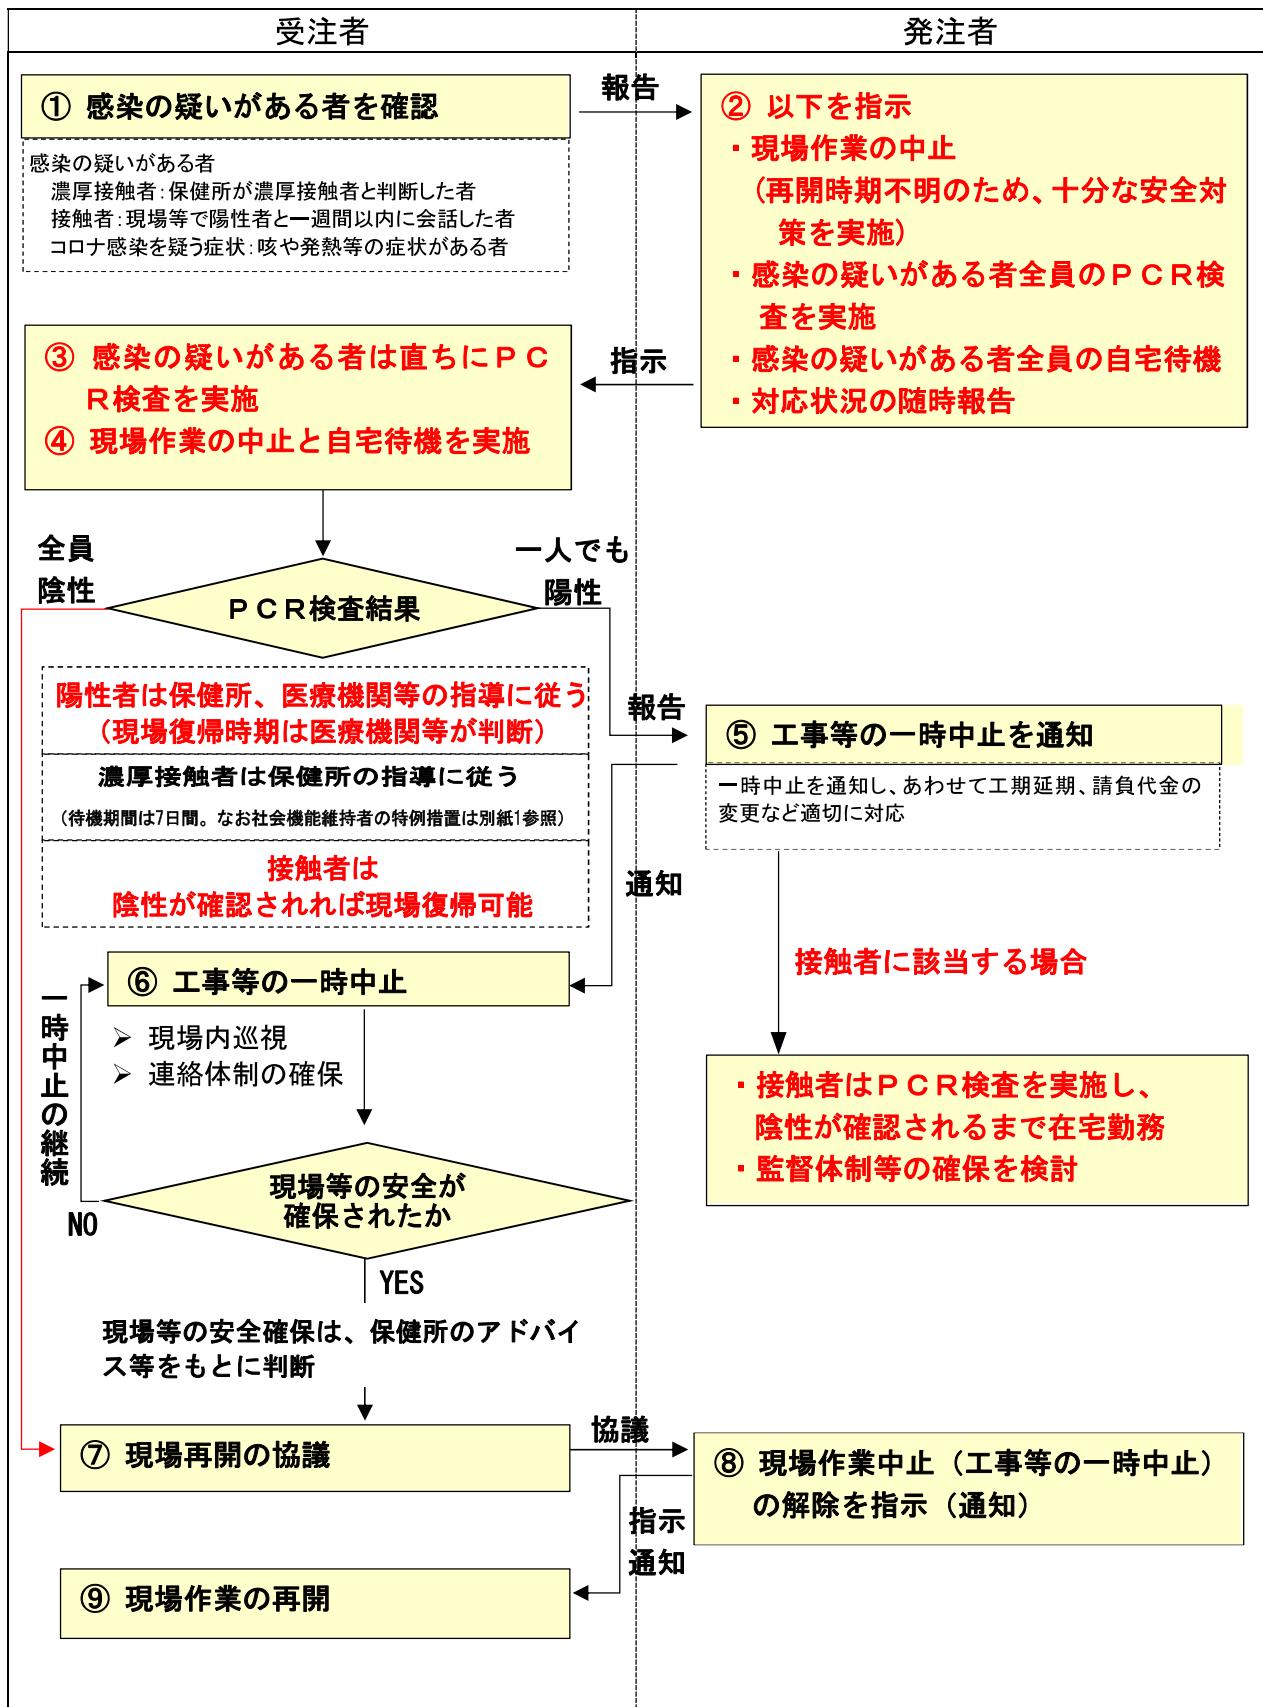

[2] 該当者が発注者側の監督員等の場合

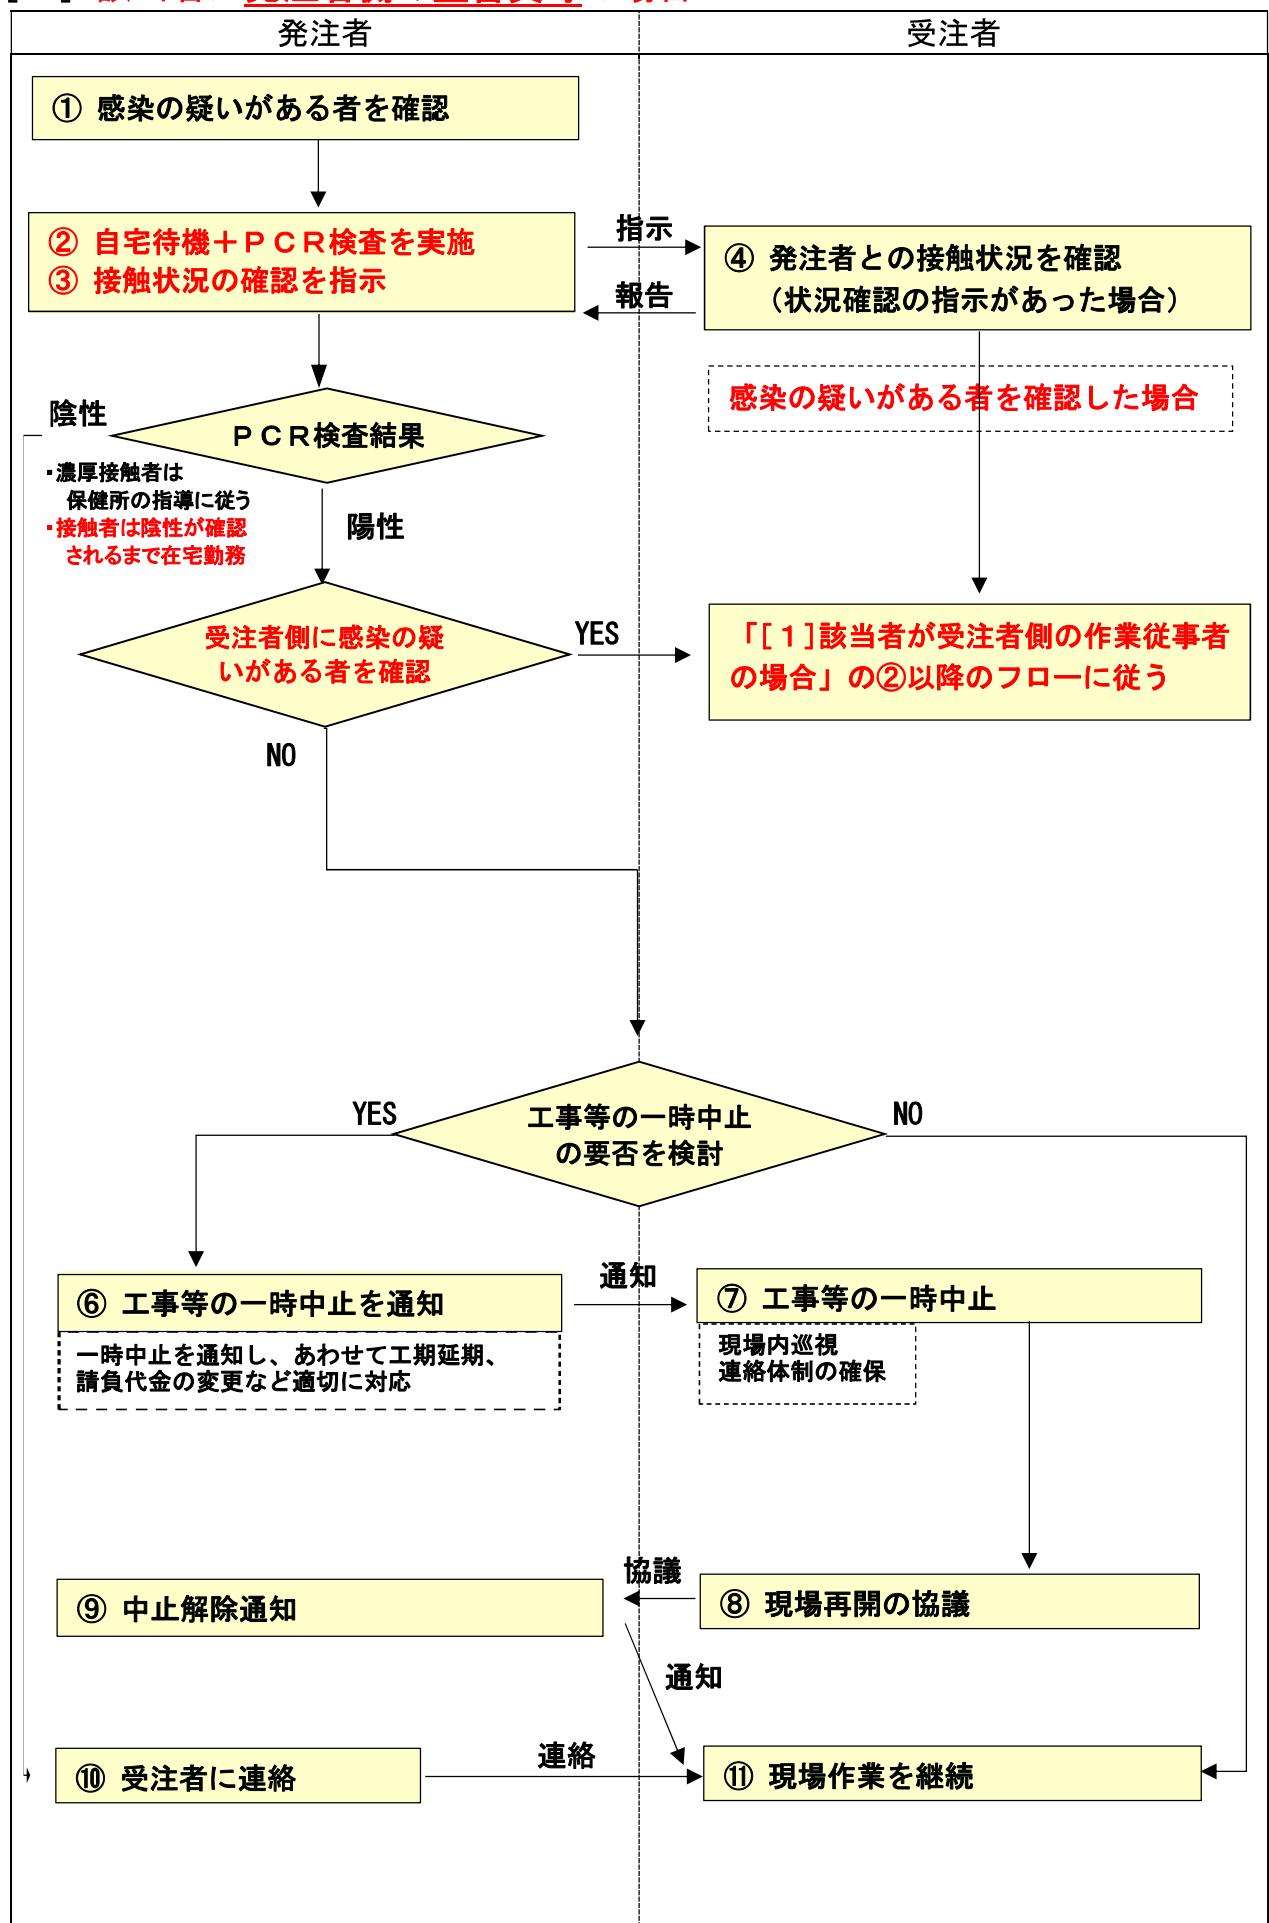

位置図

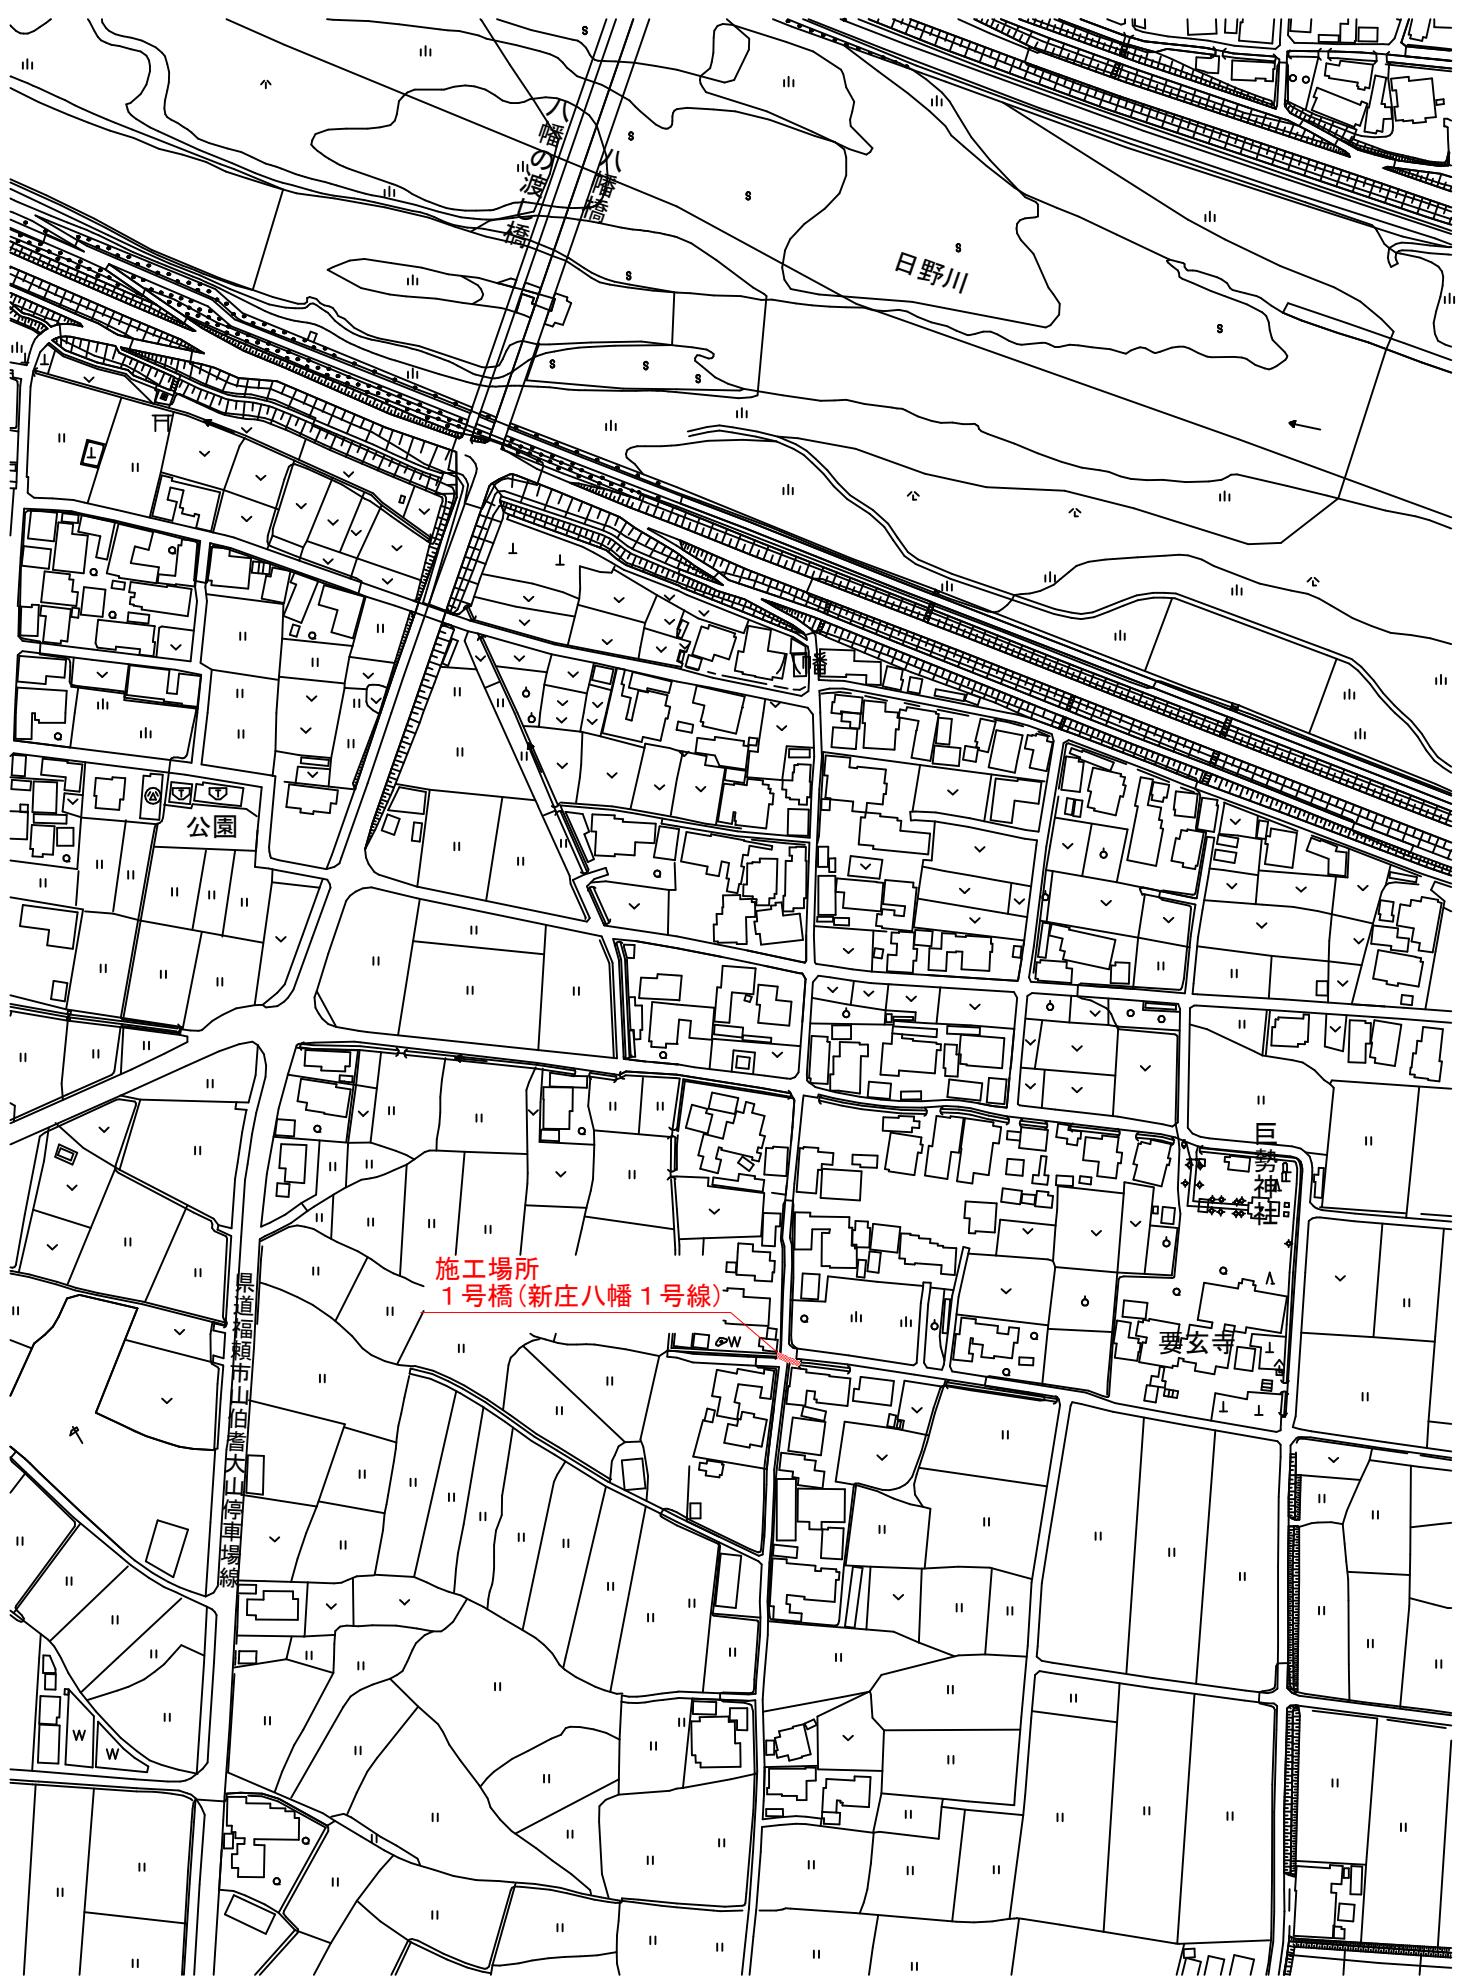

位置図



工事数量総括表

工事名	市道日原2号線1号橋ほか1橋りょう補修工事	設計表示		数量 (前回)	数量 (今回)	数量 増減	摘要
		単位	数位				
工事区分・工種・種別・細別	規 格						
本工事費							
橋梁保全工事（1号橋【新庄八幡1号線】）		式					
橋梁補修工		式					
断面修復工		式					
左官工法	鉄筋ケレン、鉄筋防錆処理を含む 修復延べ体積0.117m ³	構造物	1		1		
表面含侵工		式					
表面含浸工	シラン系鉄筋腐食抑制材	m ²	1		13		
橋梁付属物工		式					
目地充填工		式					
下地処理		m	1		4		
目地充填工	目地材充填(幅10mm×深さ20mm)	m	1		2		
目地充填工	目地材充填(幅35mm×深さ25mm)	m	1		2		
目地充填工	目地材充填(幅10mm×深さ25mm)	m	0.1		0.3		
コンクリートはつり	平均はつり厚3cm以下	m ²	0.1		0.1		
水切り設置工	EPDM系ゴム製水切り材	m	1		3		
視線誘導標設置工		式					
視線誘導標	コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射φ300 支柱径φ60.5	本	1		2		
構造物撤去工		式					
橋梁付属物撤去工		式					
視線誘導標撤去	コンクリート建込用(穿孔含まない)	本	1		1		
運搬処理工		式					
殻運搬	Co殻(無筋)	m ³	0.1		0.1		
殻処分	Co殻(無筋)	t	0.1		0.3		
仮設工		式	1		1		

工事数量総括表

工事名	市道日原2号線1号橋ほか1橋りょう補修工事				事業区分 工事区分	橋りょう補修	
	設計表示		数量 (前回)	数量 (今回)		数量 増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数位				
橋梁保全工事（1号橋【日原2号線】）		式					
橋梁補修工		式					
ひびわれ補修工（低圧注入工法）		式					
低圧注入工 (ひびわれ注入工)	補修延べ延長9.1m エポキシ樹脂系	構造物	1	1			
断面修復工		式					
左官工法	鉄筋ケレン、鉄筋防錆処理を含む 修復延べ体積0.101m ³	構造物	1	1			
表面保護工		式					
表面含浸工	シリコン系鉄筋腐食抑制材	m ²	1	7			
橋梁付属物工		式					
水切り設置工	EPDM系ゴム製水切り材	m	1	3			
視線誘導標設置工	コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射φ100以下 支柱径φ34	本	1	1			
構造物撤去工		式					
運搬処理工		式					
殻運搬	C0殻（無筋）	m ³	0.1	0.1			
殻処分	C0殻（無筋）	t	0.1	0.2			
仮設工		式	1	1			

現場説明書

令和4年1月6日改正

一般的事項1

1 仕様書

この契約において仕様書とは、特に定めのない限り「鳥取県土木工事共通仕様書」をいう。

2 下請関係の合理化について

- (1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」及び「鳥取県建設工事における下請契約等適正化指針」の趣旨に則り、優良な専門工事業者の選定、合理的な下請契約の締結、代金支払等の適正な履行、適正な施工体制の確立、下請における雇用管理等の指導等を行い本指針の遵守に努めること。
- (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、元請業者は下請業者に対して、発注者から受取った前払金の下請業者への支払い、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等、下請代金支払の適正化について配慮すること。
- (3) 請負者は、下請契約を締結した場合は、施工体制台帳及び施工体系図を発注者に速やかに提出しなければならない。また、当該施工体制台帳及び施工体系図に変更があったときは、変更が生じた日から20日以内（完成時においては、完成通知書の提出時）に変更後の書類を提出しなければならない。
- (4) 工事の一部を第三者に請け負わせる場合、又は工事に伴う交通誘導等の業務を第三者に委託する場合には、市内及び県内業者（以下「市内業者等」という。）との契約に努めること（優先順位は市内、県内の順位とする）。ただし、技術的に施工又は対応できる市内業者等がない工事等を請け負わせ又は業務を委託する場合、あるいは市内業者等で施工できても工程的に間に合わない等、特段の理由がある場合は、この限りでない。

3 建設資材等について

- (1) 工事に使用する資材については適法に生産されたものとする。
- (2) この契約に係る建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
- (3) 工事に使用する資材については、「県土整備部リサイクル製品使用基準」に基づき、リサイクル製品を積極的に活用すること。
- (4) リサイクル製品以外の工事に要する資材の使用順位は、次のとおりとする。
 - ① 市内産の資材がある場合は、市内産の資材の使用に努めること。ない場合は、県内産について同様の取り扱いとする。
 - ② 県外産の資材を使用する場合は、市内に本社又は営業所、支店等を有する販売業者（以下「市内販売業者」という。）から購入した資材の使用に努めること。市内販売業者がないときは、県内販売業者について同様の取り扱いとする。ただし、当該資材について市内販売業者又は県内販売業者がない場合は、この限りでない。

4 工事の安全確保について

この契約に係る工事の施工に当たっては、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守し、労働災害の防止に努め、また工事中の交通事故防止について、特に留意すること。

5 建設機械の使用について

- (1) 標準操作方式建設機械を使用するよう努めること。
- (2) 施工現場及びその周辺の環境改善を図るため、低騒音型・低振動型の建設機械を使用するよう努めること。
- (3) 排ガス対策型建設機械の使用については、排ガス対策型建設機械の使用基準について（平成17年11月15日付第200500080172号県土整備部長通知）によること。

6 団体加入車の使用促進について

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体の設立状況を踏まえ、同団体への加入車の使用を促進するよう努めること。

7 ダンプトラック等による運搬について

- (1) 積載重量制限を超えて工事用資機材等を積み込まず、また積み込ませないようすること。
- (2) さし杵装着車、不表示車等による違法運行は行わず、また行わせないようすること。
- (3) 過積載車両、さし杵装着車、不表示車等から工事用資機材等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
- (4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし杵装着車、不表示車等による違法運行を行っている場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
- (5) 建設副産物の処理及び工事用資機材等の搬入・搬出等に当たって、下請事業者及び工事用資機材等納入業者の利益を不当に害することのないようすること。
- (6) 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
- (7) 産業廃棄物の運搬車については、車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けること。また、産業廃棄物処理業者に委託して産業廃棄物を運搬する場合、この表示、備え付けを行わせること。
- (8) 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

8 不正軽油使用的禁止について

工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材等の搬出入車両を含む）並びに建設機械等の燃料として、地方税法（昭和25年法律第226号）に違反する軽油等を使用しないこと。

現 場 説 明 書

一般的事項 2

9 建設業退職金共済制度への加入等

- (1) 建設業者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）に加入すると共に、その建退共の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。ただし、下請けを含むすべての労働者が、中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金制度のいずれかに既に加入済みで、建退共に加入することができないと認められる場合は、この限りでない。
- (2) 建設業者が下請契約を締結する際は、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、原則として証紙を下請の延労働者数に応じて現物交付することにより、下請業者の建退共加入及び証紙の貼付を促進すること。なお、現物を交付することができない場合は、掛金相当額を下請代金中に算入することとし、契約書等に明記すること。
- (3) 請負業者は、工事現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。

10 建設業法の遵守について

- (1) 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第 26 条の規定により、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者または、専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事するもので、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。）を配置すること。
- (3) 請負業者が工事現場ごとに置かなければならぬ専任の監理技術者は、1 級施工管理技士等の国家資格者等で監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは監理技術者資格者証を提示すること。
- (4) 建設業法第 40 条の規定により、請負業者は建設現場ごとに「建設業の許可票」を掲示すること。
- (5) 上記のほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

11 労働基準法の遵守

この契約に係る工事の施工に当っては、労働基準法等の趣旨に則り法定労働時間週 40 時間を遵守すること。

12 建設業からの暴力団排除の徹底について

- (1) 工事の施工に際し、暴力団等の構成員又はこれに準ずる者から不当な要求や妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、監督員に速やかにその旨を報告するとともに、警察に届出を行い、捜査上必要な協力をを行うこと。
- (2) この場合において、工程等を変更せざるを得なくなつたときは、速やかに監督員に協議すること。

13 現場代理人、追加技術者、主任技術者及び監理技術者の雇用関係について

- (1) 工事現場に配置する技術者等（技術者等とは、現場代理人、追加技術者、主任技術者、監理技術者及び技能士をいう。）は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものでなければならない。
- (2) 直接的雇用とは、技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用及び権利構成）が存在することをいい、恒常的な雇用関係とは一定の期間（3か月以上）にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者等を工事現場に配置できるとともに技術者等が建設業者が有する技術力を、十分かつ円滑に活用して工事の監理等の業務を行うことができるることをいう。

14 労働者の福祉向上について

- (1) 建設労働者の適切な賃金水準の確保、社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入など、労働者の福祉向上に努めること。なお、健康保険等の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険等に加入するよう指導に努めること。
- (2) 下請契約の締結に際しては、下請業者へ法定福利費を内訳明示した見積書（標準見積書といふ。）の提示を求め、提示された場合にはこれを尊重するとともに、社会保険等の法定福利費などの必要経費を適切に考慮するよう努めること。

15 産業廃棄物の処理に係る税について

この契約に係る工事で発生する建設廃棄物のうち、鳥取県、岡山県、広島県等の産業廃棄物の処理に係る税条例を施行している自治体内に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税が課税される場合があるので適切に処理すること。

16 コンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比

コンクリート構造物の耐久性を向上させるため、一般環境条件の場合のコンクリート構造物に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリートについては 5.5 パーセント以下、無筋コンクリートについては 6.0 パーセント以下とする。

17 消費税及び地方消費税の適正転嫁等について

下請契約及び資材購入等において、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法（平成 25 年法律第 41 号）で禁止された転嫁拒否等行為を行わないなど、適切な対応を行うこと。

18 その他

- (1) 工事施工管理資料等については簡略化名称を使用することとする。ただし、略称については、発注者と協議の上重複しないよう注意し、また、わかりやすく簡単なものとする。
- (2) コンクリート構造物については、「コンクリート構造物ひびわれ抑制対策指針」に基づき施工するものとする。
- (3) 建設副産物のリサイクル、熱帯木材型枠の削減等、環境対策について積極的に取り組むこと。
- (4) 労務費については、法定労働時間週 40 時間を考慮したものとしている。
- (5) 請負業者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負業者は、当該下請工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）においても同様の義務を負う旨を定めなければならない。

(6) ほ装単独工事（アスファルト）においては、表層工、基層工及び上層路盤工を自社施工しなければならない。ただし、表層工、基層工及び上層路盤工であっても特殊工法部分についてはこの限りでない。

(7) 契約書第25条第5項及び第6項の対応については、鳥取県県土整備部「建設工事請負契約書第25条第5項の運用」、「賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）運用マニュアル」に基づき請求を行うこと。

現 場 説 明 書

令和4年1月6日改正
特記事項1

仕様書	本工事の施工に当たっては、契約日現在の次に掲げる仕様書等によること。 ・ <u>鳥取県土木工事共通仕様書</u> ・ <u>鳥取県土木工事施工管理基準</u> ・_____	
工程	①(他工事等との調整) ②(部分完成、着工保留) ③(施工時間) ④(余裕期間設定工事) ⑤(鋼材の調達の遅れによる工期の延長) ⑥(週休2日モデル工事)	<p>_____については、_____と関連するので相互の連絡を密にすること。</p> <p>_____については、_____まで_____(すること・しないこと)。</p> <p>本工事_____の施工時間は、<u>8:30 ~ 17:00</u>とする。</p> <p>本工事は、米子市余裕期間設定工事に係る実施要領（令和3年4月1日施行）の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。</p> <p>工期については、調達公告のとおりとする。</p> <p>この工事の工期には、鋼材調達期間として、_____か月を見込んでいるが、請負者の責に帰することができない事由により鋼材の調達が遅れ、工期内に工事を完成することができない場合は、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。</p> <p>本工事は、米子市「週休2日工事モデル工事」試行実施要領（土木工事）（令和3年4月1日施行）の対象工事である。モデル工事を選択する場合は、工事着手日までに発注者に協議をすること。選択後の取扱いについては、同要領の規定による。</p>
用地関係	①(用地・物件等未処理)	<p>本工事区間の_____には_____があるので、監督員と打合わせのうえ施工を行うこと。</p> <p>なお、_____頃_____の予定である。</p>
支障物件	①(埋設物等の事前調査) ②(支障物件) ③(立木の置き場所)	<p>工事にかかる地下埋設物等の事前調査については、[未調査・調査済み]である。</p> <p>_____の施工に当って、_____が支障となっているが、_____までに移設が完了する見込みである。</p> <p>予定どおり処理できなかった場合は別途協議する。</p> <p>工事用地内の立木は伐採し、_____に置くこと。</p>
対公害	①(騒音振動対策)	<p>「建設工事にともなう騒音振動対策技術指針」を順守すること。</p> <p>本工事の施工に当たっては、排出ガス対策型建設機械を使用すること。</p>
安全対策	①(交通安全施設等)	<p>一般交通等に支障を及ぼさないよう十分に注意して施工すること。</p> <p>なお、市道新庄八幡1号線1号橋では交通整理の必要日数<u>3</u>日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計____名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計<u>6</u>名（交代要員[有・無]）を見込んでいる。また、市道日原2号線1号橋では交通整理の必要日数<u>3</u>日を見込んでいる。配置人員として、交通誘導員Aを合計____名（交代要員[有・無]）、交通誘導員Bを合計<u>6</u>名（交代要員[有・無]）を見込んでいるが、警察等との協議により変更が生じた場合は別途協議すること。</p> <p>警備業法に規定する警備員を配置する場合においては、交通誘導員A、交通誘導員Bの定義は以下のとおりとする。</p> <p>交通誘導員Aとは、警備業法第2条第4号に規定する警備員であり、警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務に従事する者で、交通誘導警備業務に係る1級検定合格警備員又は2級検定合格警備員をいう。また、交通誘導員Bとは、警備業法第2条第3項に規定する警備業者の警備員で交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する者をいう。</p> <p>なお、自社の従業員で交通整理を行う場合は、警備業法第14条で規定する以外の者とし、安全教育、安全訓練等を十分行うこと。この場合は交通誘導員Bを配置しているとみなす。</p>
排水処理濁水	①(濁水処理)	<p>工事で発生する濁水に対しては、濁水処理を行うものとし、その工法については、設計図書によるものとする。</p> <p>なお、これにより難い場合は別途協議すること。</p>

現 場 說 明 書

特記事項 2

【建設発生土（処理）】	<p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p> <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内のセンター事業所に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり_____円をセンターに支払うこと。</p> <p>建設発生土は_____市・町・村_____地内の_____に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。なお、処理費として、1m³当たり_____円を_____に支払うこと。</p>
【コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材（処理）】	<p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材は、現場内において分別解体するものとする。その方法は、別表のとおりとする。</p> <p>なお、その費用を下記のとおり見込んでいる。</p> <p>コンクリート塊 1構造物当り 817,300 (無筋) 円 (市道新庄八幡1号線1号橋)</p> <p>コンクリート塊 1構造物当り 236,900 (無筋) 円 (市道日原2号線1号橋)</p> <p>アスファルト塊 1m² 当り _____ 円</p> <p>建設発生木材 1m³ 当り _____ 円</p> <p>[Co 雜割材・_____]は、_____市・町・村_____地内_____工事現場に運搬（片道運搬距離_____km）するものとする。</p>
④ (分別解体等)	<p>コンクリート塊、アスファルト塊、建設発生木材等は、再生資源として、下記の再資源化施設への搬出を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが搬出先を変更する場合は理由を付して協議を行うこと。</p> <p>再資源化施設業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。</p>
(施設の名称・受入れ費用)	<p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>なお、再資源化施設へ搬出が完了したときは、書面により報告すること。</p> <p>(市道新庄八幡1号線1号橋)</p> <p>コンクリート塊 米子 市・町・村 淀江町稻吉 地内の (株) 大協組 (運搬距離 13.1 km)、費用 1t 当り 800 円</p> <p>(市道日原2号線1号橋)</p> <p>コンクリート塊 米子 市・町・村 淀江町稻吉 地内の (株) 大協組 (運搬距離 13.7 km)、費用 1t 当り 800 円</p>
(受入れ時間帯) (受入れ条件)	<p>アスファルト塊 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用 1t 当り _____ 円</p> <p>建設発生木材 _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ (運搬距離 _____ km)、費用 1t 当り _____ 円</p>
8時～17時（平日） ア (受入れ時間帯) イ (受入れ条件)	<p>ア 路盤材、土砂、金属片等が、混入していないこと。</p> <p>イ コンクリート塊、アスファルト塊の径は 500mm 以下であること。</p> <p>ウ 建設発生木材に関しては、泥等の付着がなく、径 _____ cm 以下、長さ _____ m 以下であること。</p> <p>エ 2次公害発生の恐れがある物質（廃油等）を含まないこと。</p>
建設発生木材は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、_____ 円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。	<p>建設発生木材は _____ 市・町・村 _____ 地内の _____ への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、_____ 円を見込んでいる。これは、他の木材市場等への売却を妨げるものではないが、売却先を変更する場合は理由を付して協議すること。</p>
_____ については、_____ 市・町・村 _____ 地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、その費用として 1t 当たり _____ 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。	<p>_____ については、_____ 市・町・村 _____ 地内の産業廃棄物処理場への搬出（片道運搬距離 _____ km）を想定し、その費用として 1t 当たり _____ 円を見込んでいる。これは、他の施設へ搬出を妨げるものではないが、搬出先を変更する場合は協議を行うこと。</p>
産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。	<p>産業廃棄物処理業者等と書面による委託契約を行うとともに、運搬車両ごとにマニフェストを発行するものとする。</p>

現 場 説 明 書

特記事項3

建設副産物の使用	①(建設発生土の使用)	_____工事から〔当該工事運搬・相手方運搬〕の建設発生土を受入れ、使用箇所：に使用する。												
	②(再生資材の使用)	1) CO雜割材は、_____工事から運搬し、 使用箇所：_____に使用する。 2) アスファルト・コンクリート切削殻は、_____から運搬し、 使用箇所：_____に使用する。 3) 再生クラッシャーラン〔規格：〕は、 使用箇所：_____に使用する。 4) 再生加熱アスファルト混合物〔規格：粗粒度20mm〕は、 使用箇所：_____に使用する。 5) その他再生資材〔資材名：〕〔規格：〕は、 使用箇所：_____に使用する。												
工事用														
仮設備														
その他	①(労災補償に必要な保険の付保) ②(現場環境改善)	本工事において、請負者は労災補償に必要な任意の保険契約を締結すること。なお、この労災補償に必要な保険契約の保険料を予定価格に反映している。 本工事は、現場環境改善(率計上分)実施対象工事と〔する・しない〕。 下表の内容のうち原則として各費目(仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携)ごとに1実施内容ずつ(いずれか1項目のみ2実施内容)の合計5つの実施内容を実施すること。港湾及び漁港事業は、項目に防災・危機管理関係を含めることができる。 実施に当たっては、施工計画書に実施内容及び実施時期を記載し、実施後に監督員に写真等を提出すること。 地域の状況・工事内容により組み合わせ、費目数及び実施内容を変更する場合は、原則として設計変更は行わないが、その内容(目的に資するものであること)について監督員の確認を受けること。 1内容も実施困難な場合は、監督員と協議の上、設計変更により率計上は行わない。												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">計上費目</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">仮設備関係</td> <td style="padding: 2px;"> 1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">営繕関係</td> <td style="padding: 2px;"> 1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス(交通誘警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">安全関係</td> <td style="padding: 2px;"> 1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報機等) 3. 避暑(熱中症予防)・防寒対策 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">地域連携</td> <td style="padding: 2px;"> 1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献 </td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">防災・危機管理関係(港湾・漁港事業)</td> <td style="padding: 2px;"> 1. 防災訓練(地震・台風等の自然災害に対する訓練) </td></tr> </tbody> </table>	計上費目	実施内容	仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減	営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス(交通誘警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等	安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報機等) 3. 避暑(熱中症予防)・防寒対策	地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献	防災・危機管理関係(港湾・漁港事業)	1. 防災訓練(地震・台風等の自然災害に対する訓練)
計上費目	実施内容													
仮設備関係	1. 用水・電力等の供給設備、2. 緑化・花壇 3. ライトアップ施設、4. 見学路及び椅子の設置 5. 昇降設備の充実、6. 環境負荷の低減													
営繕関係	1. 現場事務所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2. 労働者宿舎の快適化 3. デザインボックス(交通誘警備員待機室) 4. 現場休憩所の快適化 5. 健康関連設備及び厚生施設の充実等													
安全関係	1. 工事標識・照明・安全具等安全施設のイメージアップ(電光式標識等) 2. 盗難防止対策(警報機等) 3. 避暑(熱中症予防)・防寒対策													
地域連携	1. 完成予想図、2. 工法説明図、3. 工事工程表 4. デザイン工事看板(各工事PR看板含む) 5. 見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6. 見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営 7. パンフレット・工法説明ビデオ 8. 地域対策費等(地域行事等の経費を含む) 9. 社会貢献													
防災・危機管理関係(港湾・漁港事業)	1. 防災訓練(地震・台風等の自然災害に対する訓練)													

※明示する項目を_____部分に記入又は追記し、不要部分は——で削除して使用すること。

別表3

(A4)

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)

分別解体等の計画等

工作物の構造 (解体工事のみ)	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> その他()			
工事の種類	<input type="checkbox"/> 新築工事 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・修繕工事 <input type="checkbox"/> 解体工事 <input type="checkbox"/> 電気 <input type="checkbox"/> 水道 <input type="checkbox"/> ガス <input type="checkbox"/> 下水道 <input type="checkbox"/> 鉄道 <input type="checkbox"/> 電話 <input type="checkbox"/> その他()			
使用する特定建設資材の種類 (新築・維持・修繕工事のみ)	<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート <input type="checkbox"/> コンクリート及び鉄から成る建設資材 <input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート <input type="checkbox"/> 木材			
工作物の状況	築年数 不明 その他()			
工作物に関する調査の結果	周辺状況 周辺にある施設 <input checked="" type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input type="checkbox"/> その他() 敷地境界との最短距離 約 1 m その他()			
工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容		工作物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容	
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他(河川、道路内での作業)		
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有() <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 4m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他()		
	特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)	<input type="checkbox"/> 有 () <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	その他		周辺住民への周知	
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)	
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	④本体構造	本体構造の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
	⑥その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用	
工事の工程の順序 (解体工事のみ)		<input type="checkbox"/> 上の工程における⑤→④→③の順序 <input type="checkbox"/> その他() その他の場合の理由()		
工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ)		トン		
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)	種類	量の見込み	使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	0.5 トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input checked="" type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
		<input type="checkbox"/> 建設発生木材	トン	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥
(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他				
備考				

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。


(別紙)

施工箇所が点在する工事の間接工事費の積算方法 現場説明書


本工事における一般管理費は、施工箇所毎に分けない積算と同様とするが、共通仮設費及び現場管理費の金額は、工事箇所毎に算出した共通仮設費及び現場管理費を合計した金額としている。なお、共通仮設費率、現場環境改善費率、及び現場管理費率の補正については、工事箇所毎に設定している。一般管理費算出時の共通仮設費率、及び現場管理費率にかかる施工地域を考慮した補正は、新庄八幡1号線1号橋の設計書で設定した係数とする。

工事箇所名	施工箇所名
米子市日原地内	日原2号線1号橋
米子市八幡地内	新庄八幡1号線1号橋

《工事費体系イメージ図》

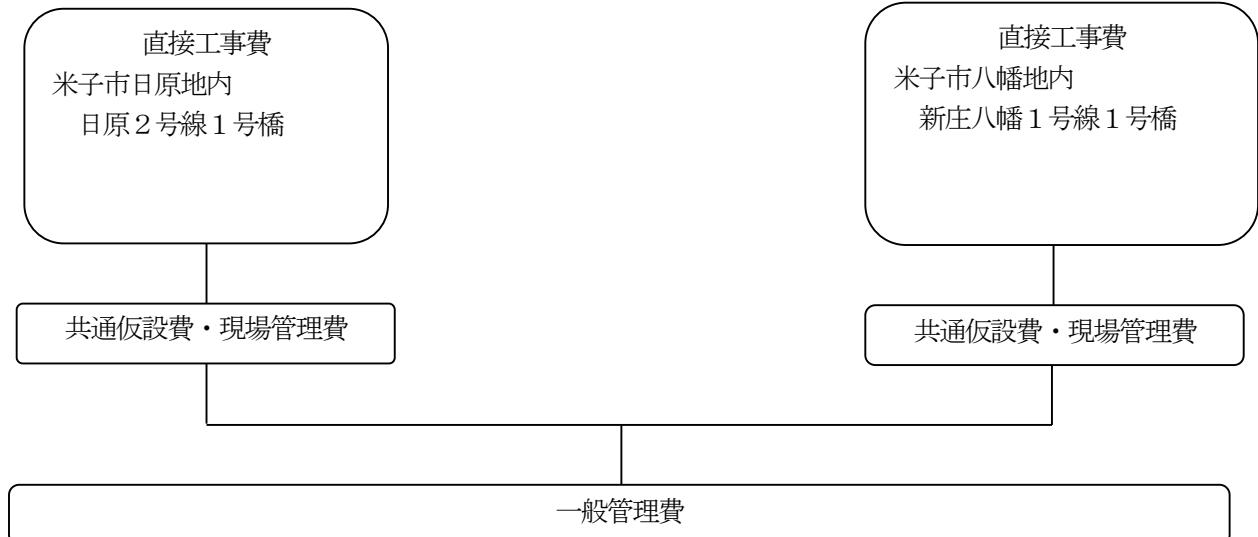

《工事箇所位置図》

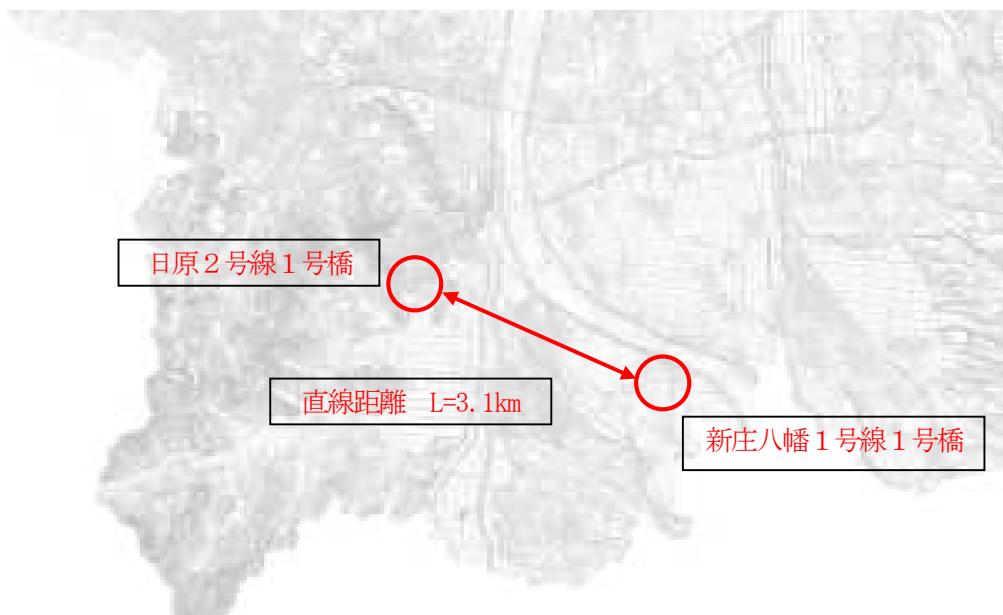

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 04-*****-11 -40 0 1 実施単価 30 米子市 0-04.07.10(0) 1 公共
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	当世代 38 橋梁保全工事 01 率計上する（地方部） 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費				X1000	
橋梁保全工事【1号橋(市道新庄八幡1号線)】		一式		Y1G03 (レベル1)	
橋梁補修工		一式		Y1G0324 (レベル2)	
断面修復工		一式		Y1G032405 (レベル3)	
左官工法		構造物		Y1G03240501 (レベル4)	
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.117m ³	1	構造物		S1020041 0 A=0.117, B=6, C=0.117 单第0-0001 表 040710	
表面含浸工		一式		Y3999 (レベル3)	
表面含浸工		一式		Y4999 (レベル4)	
表面含浸工	13	m ²		V0006 0 单第0-0002 表 040710	

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁付属物工				Y3999	(レベル3)
		一式			
目地充填工				Y4999	(レベル4)
		一式			
下地処理	4	m		V0002 0	
					単第0-0003 表 040710
目地充填工 目地材充填(幅10mm×深さ20mm)	2	m		V0003 0	
					単第0-0004 表 040710
目地充填工 目地材充填(幅35mm×深さ35mm)	2	m		V0004 0	
					単第0-0005 表 040710
目地充填工 目地材充填(幅10mm×深さ25mm)	0.3	m		V0005 0	
					単第0-0006 表 040710
コンクリートはつり 平均はつり厚3cm以下	0.1	m ²		SPK21040104 0 A=1, B=1	
					単第0-0007 表 040710
水切り設置工				Y4999	(レベル4)
		一式			
水切り設置工 EPDM系ゴム製水切り材	3	m		V0001 0	
					単第0-0008 表 040710

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
視線誘導標設置工		一式		Y4999	(レベル4)
視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む) 設置 - 片面反射 反射体_径 φ300 [規]10本未満	2	本		SS000079 0 A=1, B=1, C=2, D=2, F=3, H=1, I=1	单第0-0009 表 040710
構造物撤去工		一式		Y1G0327	(レベル2)
橋梁付属物撤去工		一式		Y1G032703	(レベル3)
視線誘導標撤去		本		Y1G03270301	(レベル4)
視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない) 撤去 [規]10本未満	1	本		SS000081 0 A=2, F=3, H=1	单第0-0010 表 040710
運搬処理工		一式		Y1G032716	(レベル3)
殻運搬		m3		Y1G03271601	(レベル4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	0.1	m3		SPK21040138 0 A=1, B=1, C=1, D=50, E=1	单第0-0011 表 040710

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
殻処分		m3			Y1G03271602 (レベル4)
投棄料		一式			#0041 A=工種金額累計なし, B=工種金額累計なし, C=
Co殻(無筋) (株)大協組	0.3	t		TTV0430 0 040710	
仮設工		一式			Y1G0328 (レベル2)
交通管理工		一式			Y1G032821 (レベル3)
交通誘導警備員		人			Y1G03282101 (レベル4)
交通誘導警備員B	6	人		R0369 0 040710 1	
直接工事費					
技術管理費				Z0006	

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋探査	1	箇所			V0007 0 单第0-0012 表 040710
現場環境改善費					Z0012
共通仮設費					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率 分					
契約保証費					

本工事費 内訳書

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

施工単価表

单第0-0001 表

1 構造物 当り

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)

S1020041

修復延べ体積 0. 1 1 7 m³

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.691	人			RTPC00009 9
特殊作業員	4.446	人			RTPC00001 9
普通作業員	2.925	人			RTPC00002 9
ポリマーセメントモルタル	0.138	m ³			F0000000006 県単価
諸雑費	11	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=0.117 1構造物当たり修復延べ体積(m ³ /構造物) C=0.117 断面修復材の設計数量(m ³ /構造物)			B=6 【F】 断面修復材(m ³)		
土木一般世話役 = V / 0.1 * D2 = 0.11700000 / 0.1 * 2.3 = 2.691(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = V / 0.1 * D2 = 0.117000000 / 0.1 * 3.8 = 4.446(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = V / 0.1 * D2 = 0.117000000 / 0.1 * 2.5 = 2.925(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
断面修復材の使用数量 = 設計数量(m ³) * (1 + ロス率) = 0.117000000 * (1 + 0.18) = 0.138(m ³) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

表面含浸工

V0006

施工単価表

单第0-0002 表

頁0-0009

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理 時間的制約無 高所作業車無	100	m ²			T0000000001 土木コスト情報 2022.4 P442
含浸材塗布 時間的制約無 高所作業車無	100	m ²			T0000000002 土木コスト情報 2022.4 P442
シラン系表面含浸材 プロテクトシリ CIT相当	66	L			F0000000003 建設物価 2022.7 P195
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

下地処理

V0002

施工単価表

单第0-0003 表

頁0-0010

100 m 当り

考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3	人			RTPC00009 9
特殊作業員	3	人			RTPC00001 9
普通作業員	6	人			RTPC00002 9
機械器具損料 ガスバーナー等	1	台			T0000000003 見積り
諸雑費	20	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

单第0-0004 表

100 m 当り

目地充填工

V0003

目地材充填(幅10mm×深さ20mm)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 9
防水工	2	人			RTA0052 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
ゴム状弾性目地材 TS目地ガードN充填用 相当	33.6	k g			F0000000005 見積り
マスキングテープ 21mm	240	m			F0000000004 見積り
諸雑費	10	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

单第0-0005 表

100 m 当り

目地充填工

V0004

目地材充填(幅35mm×深さ35mm)

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2	人			RTPC00009 9
防水工	4	人			RTA0052 9
普通作業員	4	人			RTPC00002 9
ゴム状弾性目地材 TS目地ガードN充填用 相当	122.5	k g			F0000000005 見積り
マスキングテープ 21mm	200	m			F0000000004 見積り
雑材料	20	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

单第0-0006 表

100 m 当り

目地充填工

目地材充填(幅10mm×深さ25mm)

V0005

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1	人			RTPC00009 9
防水工	2	人			RTA0052 9
普通作業員	1	人			RTPC00002 9
ゴム状弾性目地材 TS目地ガードN充填用 相当	25	k g			F0000000005 見積り
マスキングテープ 21mm	200	m			F0000000004 見積り
雑材料	10	%			#09
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

单第0-0007 表

1 m2 当り

コンクリートはつり

平均はつり厚3cm以下

機械構成比 : 1.69% 労務構成比 : 94.47% 材料構成比 : 3.84% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.65%		空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min		KTPC00030 KTPT00030
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	38.62%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	31.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	21.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	3.73%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

頁0-0015

施工單価表

单第0-0007 表

頁0-0015

コンクリートはつり

平均はつり厚3cm以下

機械構成比 : 1.69% 労務構成比 : 94.47% 材料構成比 : 3.84% 市場単価構成比 : 0.00% 標準単価 :

施工単価表

单第0-0008 表

100 m 当り

水切り設置工

EPDM系ゴム製水切り材

V0001

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	4	人			RTPC00002
EPDM系ゴム製水切り材 ウォーターカッター相当	100	m			F0000000001 見積り
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む)
設置 - 片面反射 反射体 径φ300

SS000079

施工單価表

单第0-0009 表

頁0-0017

1 本 当り

視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない)
撤去

SS000081

施工單価表

单第0-0010 表

頁0-0018

1 本 当り 老

施工単価表

单第0-0011 表

m3 当り

1

標準単価:

般運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

SPK21040138 DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

機械構成比: 43.38% 労務構成比: 41.88%

材料構成比: 14.74% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=50 運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施工単価表

10 箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (外業)	0.5	人		R0880	1
技師 (B) (外業)	1.0	人		R0890	1
技師 (C) (外業)	1.0	人		R0900	1
雑材料	5	%		#01	
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系 ファイル名	54 米子市 実施設計書 当初 04-*****-10 -40 0 1 実施単価 30 米子市 0-04.07.10(0) 1 公共
工種 現場環境改善費 施工地域 契約保証区分 豪雪割増 工期算定区分 週休二日補正係数	当世代 38 橋梁保全工事 01 率計上する（地方部） 13 一般交通影響有り(2) 01 金銭保証(0.04%) 01 豪雪割増あり 02 算出しない 01 週休二日補正なし

本工事費 内訳書

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費				X1000	
橋梁保全工事【1号橋(市道日原2号線)】		一式		Y1G03	(レベル1)
橋梁補修工		一式		Y1G0324	(レベル2)
ひび割れ補修工		一式		Y1G032404	(レベル3)
低圧注入工法		構造物		Y1G03240402	(レベル4) H=週休二日補正なし, I=豪雪割増あり
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長25m未満の場合	1	構造物		S1020035 0 A=7, B=0.19, C=8, D=2.17, E=9, F=37	单第0-0001 表 040710
断面修復工		一式		Y1G032405	(レベル3)
左官工法		構造物		Y1G03240501	(レベル4)
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積0.101m ³	1	構造物		S1020041 0 A=0.101, B=6, C=0.101	单第0-0002 表 040710

本工事費 内訳書

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表面保護工		一式		Y3999	(レベル3)
表面含浸工		一式		Y4999	(レベル4)
表面含浸工	7	m ²		V0002 0 単第0-0003 表 040710	
橋梁付属物工		一式		Y3999	(レベル3)
水切り設置工		一式		Y4999	(レベル4)
水切り設置工 EPDM系ゴム製水切り材	3	m		V0001 0 単第0-0004 表 040710	
視線誘導標設置工		一式		Y4999	(レベル4)
視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む) 設置 - 両面反射 反射体_径 φ100以下 支柱径 φ34 [規]10本未満	1	本		SS000079 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=3, H=1, I=1 単第0-0005 表 040710	
構造物撤去工		一式		Y1G0327 (レベル2)	

本工事費 内訳書

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工		一式			Y1G032716 (レベル3)
殻運搬		m3			Y1G03271601 (レベル4)
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	0.1	m3			SPK21040138 0 A=1, B=1, C=2, D=50, E=1 単第0-0006 表 040710
殻処分		m3			Y1G03271602 (レベル4)
投棄料		一式			#0041 C=投棄料
Co殻(無筋) (株)大協組 県単価	0.2	t			TTV0430 0 040710
仮設工		一式			Y1G0328 (レベル2)
交通管理工		一式			Y1G032821 (レベル3)
交通誘導警備員		人			Y1G03282101 (レベル4)

本工事費 内訳書

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	6	人		R0369 0	040710 1
直接工事費					
技術管理費				Z0006	
鉄筋探査	1	箇所		V0003 0	単第0-0007 表 040710
現場環境改善費				Z0012	
共通仮設費					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					

本工事費 内訳書

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価					
一般管理費率 分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

ひび割れ補修工(低圧注入工法)
補修延べ延長25m未満の場合

S1020035

施工単価表

单第0-0001 表

1 構造物 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.500	人			RTPC00009 9
特殊作業員	2.400	人			RTPC00001 9
普通作業員	1.800	人			RTPC00002 9
エポキシ樹脂注入材 3種	0.190	k g			F0000000007 県単価
シール材 エポキシ樹脂系	2.973	k g			F0000000008 県単価
注入器	37.000	個			F0000000009 見積り
諸雑費	6	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=7 【F】注入材(kg) C=8 【F】シール材(kg) E=9 【F】低圧注入器具(個)			B=0.19 D=2.17 F=37	注入材の必要数量(kg/構造物) シール材の設計数量(kg/構造物) 低圧注入器具の必要数量(個/構造物)	
シール材の材料使用数量 = 設計数量(kg) * (1 + ロス率) = 2.170000000 * (1 + 0.37) = 2.973(kg) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

施工単価表

单第0-0002 表

1 構造物 当り

断面修復工(左官工法)
(鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む)

S1020041

修復延べ体積 0.101m³

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.323	人			RTPC00009 9
特殊作業員	3.838	人			RTPC00001 9
普通作業員	2.525	人			RTPC00002 9
ポリマーセメントモルタル	0.119	m ³			F0000000006 県単価
諸雑費	11	%			#09
*** 単位当たり ***	1	構造物			
A=0.101 1構造物当たり修復延べ体積(m ³ /構造物) C=0.101 断面修復材の設計数量(m ³ /構造物)			B=6 【F】 断面修復材(m ³)		
土木一般世話役 = V / 0.1 * D2 = 0.1010000000 / 0.1 * 2.3 = 2.323(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 特殊作業員 = V / 0.1 * D2 = 0.1010000000 / 0.1 * 3.8 = 3.838(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め 普通作業員 = V / 0.1 * D2 = 0.1010000000 / 0.1 * 2.5 = 2.525(人) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					
断面修復材の使用数量 = 設計数量(m ³) * (1 + ロス率) = 0.1010000000 * (1 + 0.18) = 0.119(m ³) 小数第4位四捨五入小数第3位止め					

表面含浸工

V0002

施工単価表

单第0-0003 表

頁0-0009

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下地処理 時間的制約無 高所作業車無	100	m ²			T0000000001 土木情報コスト 2022.4 P442
含浸材塗布 時間的制約無 高所作業車無	100	m ²			T0000000002 土木情報コスト 2022.4 P443
シラン系表面含浸材 プロテクトシリCIT相当	66	L			F0000000005 建設物価 2022.7 p195
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

04*****-10 -40

米子市

V0001

施工単価表

单第0-0004 表

100 m 当り

水切り設置工

EPDM系ゴム製水切り材

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2	人			RTPC00009
特殊作業員	2	人			RTPC00001
普通作業員	4	人			RTPC00002
EPDM系ゴム製水切り材 ウォーターカッター相当	100	m			F0000000001 見積り
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

頁0-0011

施工單価表

单第0-0005 表

1 本 当り

視線誘導標(Co建込用)(穿孔含む)

SS000079

設置 - 両面反射 反射体_径 ϕ 100以下

支柱径 ϕ 34 [規]10本未満

施工単価表

单第0-0006 表

m3 当り

1

標準単価：

般運搬

Co(無筋)構造物とりこわし

機械構成比： 43.38% 労務構成比：

SPK21040138 DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

41.88% 材料構成比： 14.74% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	43.38%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
一般運転手	41.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 小型ローリー(パトロール給油)	14.74%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=50 運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施工単価表

10 箇所 当り
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A) (外業)	0.5	人		R0880	1
技師 (B) (外業)	1.0	人		R0890	1
技師 (C) (外業)	1.0	人		R0900	1
雑材料	5	%		#01	
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

補修工事数量総括表

(1 号橋 【日原 2 号線】)

1.1 補修数量総括表

橋梁名：1号橋(市道 日原2号線)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	備考
橋梁保全工事	構造物補修工	ひびわれ補修工 (低圧注入工法)	低圧注入工法 (ひびわれ注入工)	エポキシ樹脂系3種	m	9.1	
				シール材(エポキシ樹脂系)	kg	2.17	
				注入材(エポキシ樹脂系3種)	kg	0.19	
				注入器(低圧注入器)	個	37	
		断面修復工	左官工法	鉄筋ケレン、鉄筋防錆処理を含む ポリマーセメントモルタル	m ³	0.101	
	橋梁補修工	表面含浸工	下地処理工	サンダーケレン	m ²	7.4	
			含浸材塗布工	シラン系鉄筋腐食抑制材	m ²	7.4	
			含浸材	シラン系鉄筋腐食抑制材	ℓ	4.9	
	橋梁付属物工	水切り設置工	水切り材設置	EPDM系ゴム製水切り材	m	3.4	
		視線誘導標設置工	視線誘導標設置	コンクリート建込	本	1	
	構造物撤去工	運搬処理工	殻運搬	コンクリート塊(無筋)	m ³	0.1	
			殻処分	コンクリート塊(無筋)	t	0.2	
	仮設工	交通整理工	交通整理員	交通整理員B	式	1	

1.2 ひびわれ補修工

1.2.1 低圧注入工法（ひびわれ注入工）

(1) 延べ施工量

エポキシ樹脂注入材3種

$$L = 9.05 \text{ m} = 9.05 \text{ m}$$

(2) シール材

1) エポキシ樹脂系

$$\sum L = 9.05 \text{ m} \text{ (総延長)}$$

$$w = 50 \text{ mm} \text{ (幅)}$$

$$t = 3 \text{ mm} \text{ (厚さ)}$$

$$\gamma = 1.60 \text{ (単位体積重量)}$$

$$W = 9.05 \times 0.050 \times 0.003 \times 1.60 \times 1000 = 2.17 \text{ kg}$$

(3) 注入材

1) エポキシ樹脂注入材3種

$$\sum L = 9.05 \text{ m} \text{ (総延長)}$$

$$w = 0.26 \text{ mm} \text{ (幅)}$$

$$t = 51 \text{ mm} \text{ (厚さ)}$$

$$\gamma = 1.15 \text{ (単位体積重量)}$$

$$W = 9.05 \times 0.00026 \times 0.051 \times 1150 \times 1.37 = 0.19 \text{ kg}$$

ロス率37%

(4) 注入器 (低圧注入器)

・設置間隔 : 250mm間隔

$$\sum L = 9.05 \text{ m} \text{ (総延長)}$$

$$N = 9.05 / 0.25 = 37 \text{ 個}$$

1.2.2 ひびわれ延長数量計算書

番号	部 位	ひびわれ		遊離石灰を伴う L (m)	深さ t (mm)	備 考
		w (mm)	L (m)			
I	桁下面					
1		0.25	0.65		50	
2		0.30	1.50		60	
4		0.20	0.50		40	
5		0.20	0.25		40	
6		0.20	0.50		40	
7		0.20	0.50		40	
8		0.20	0.80		40	
11		0.20	0.45		40	
12		0.30	0.30		60	
15		0.30	0.65		60	
18		0.20	0.45		40	
19		0.35	0.85		70	
20		0.25	0.55		50	
21		0.30	0.80		60	
22		0.20	0.30		40	
	小計		9.05			注入 : エポキシ3種
0.2≤w<0.5mm 合計延長	幅 加重平均	9.05	-	深さ 加重 平均		
0.5≤w<1.0mm 合計延長	(注入工のみ)	-	-			
1.0≤w≤5.0mm 合計延長	0.26	-	-			
5.0mm<w 合計延長	-	-	-	51		
遊離石灰を伴う 合計延長	-	-	-			
	w<0.2mm	0.2≤w <0.5mm	0.5≤w <1.0mm	1.0≤w ≤5.0mm	5.0mm<w 遊離石灰 を伴う	合 計
注入 : エポキシ1種合計	-	-	-	-	-	-
注入 : エポキシ2種合計	-	-	-	-	-	-
注入 : エポキシ3種合計	-	9.05	-	-	-	9.05
注入 : セメント系合計	-	-	-	-	-	-
注入 : 亜硝酸 + エポキシ3種合計	-	-	-	-	-	-
注入 : 亜硝酸 + セメント系合計	-	-	-	-	-	-
充填 : ポリマーセメント系合計	-	-	-	-	-	-
充填 : 可とう性エポキシ樹脂系合計	-	-	-	-	-	-
充填 : シーラント系合計	-	-	-	-	-	-
合 計	-	9.05	-	-	-	9.05

1.3 断面修復工 (左官工法)

※断面修復深さは、はつり調査結果より60mmとした。

1.3.1 左官工法

(1) 延べ施工量

1) ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理を含む

$$v1 = 0.101 \quad = 0.101 \text{ m}^3$$

$$v2 = 0.101 \times 0.18 \quad = 0.018 \text{ m}^3$$

ロス率18%

$$\Sigma V = 0.119 \text{ m}^3$$

1.3.4 左官工法 數量計算書

1.4 表面保護工（表面含浸工）

1.4.1 表面含浸工 (シラン系鉄筋腐食抑制材)

(1) 下地処理 (サンダーケレン)

$$A = 7.410 \quad = 7.410 \text{ m}^2$$

(2) 含浸材塗布工 (シラン系鉄筋腐食抑制材)

$$A = 7.410 \quad = 7.410 \text{ m}^2$$

(3) 含浸材 (シラン系鉄筋腐食抑制材)

$$v1 = 7.410 \times 0.60 \text{ l/m}^2 \quad = 4.446 \text{ l}$$

標準使用量

$$v2 = 4.446 \times 0.10 \quad = 0.445 \text{ l}$$

ロス率10%

$$\sum W = 4.891 \text{ l}$$

1.4.2 表面保護工数量計算書

1.5 水切り工

1.5.1 水切り材設置 (EPDM系ゴム製水切り材)

$$\text{上流側} \quad \text{下流側}$$
$$L = 1.710 + 1.710 = 3.420 \text{ m}$$

1.6 視線誘導標設置工

1.6.1 視線誘導標設置

N = 1 = 1 本

1.7 運搬処理工

1.7.1 製運搬

(1) コンクリート構造物（無筋） 人力積込

1) 断面修復工（左官工法）

$$V_1 = 0.101 \quad = 0.101 \text{ m}^3$$

1.7.2 製処分 (がれき類)

$$V = 0.101 \quad = 0.101 \text{ m}^3$$

$$W = 0.101 \times 2.35t \quad = 0.237 t$$

1.8 交通整理工

1.8.1 交通整理員

(1) 交通整理員B 1式 = 6人

2.1 補修数量総括表

橋梁名：1号橋(市道新庄八幡1号線)

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	数量	備考
橋梁保全工事	構造物補修工	断面修復工 (左官工法)	左官工法	鉄筋ケレン、鉄筋防錆処理を含む ポリマーセメントモルタル	m ³	0.117	
	橋梁補修工	表面保護工 (表面含浸工)	下地処理	サンダーケレン	m ²	13.0	
			含浸材塗布工	シラン系鉄筋腐食抑制材	m ²	13.0	
			含浸材	シラン系鉄筋腐食抑制材	ℓ	8.6	
	橋梁付属物工	目地材充填工	下地処理	遊間部清掃	m	4.2	
			目地材充填	ゴム状高弹性目地材 10×20mm	m	2.3	
				ゴム状高弹性目地材 35×35mm	m	1.6	
				ゴム状高弹性目地材 10×25mm	m	0.3	
			コンクリートはつり		m ²	0.07	
	水切り設置工	水切り材	EPDM系ゴム製水切り材		m	2.8	
	視線誘導標設置工	視線誘導標設置			本	2	
	構造物撤去工	橋梁付属物撤去工	視線誘導標撤去	コンクリート建込	本	1	
		運搬処理工	殻運搬	Co殻（無筋）	m ³	0.1	
			殻処分	Co殻（無筋）	t	0.3	
	仮設工	交通整理工	交通整理員	交通整理員B	式	1	

2.2 断面修復工（左官工法）

※断面修復深さは、はつり調査結果より50mmとした。

2.2.1 左官工法

(1) 延べ施工量

1) ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・防錆処理を含む

$$v1 = 0.117 \quad = 0.117 \text{ m}^3$$

$$v2 = 0.117 \times 0.18 \quad = 0.021 \text{ m}^3$$

ロス率18%

$$\Sigma V = 0.138 \text{ m}^3$$

2.2.4 左官工法 数量計算書

※補修深さの設定

鐵筋露出箇所

主筋かぶり	10mm
主筋径	16mm (鍛有)
配力筋径	9mm
	35mm → 50mm

2.3 表面保護工（表面含浸工）

2.3.1 表面含浸工 (シラン系鉄筋腐食抑制材)

(1) 下地処理 (サンダーケレン)

$$A = 12.955 \text{ m}^2$$

(2) 含浸材塗布工 (シラン系鉄筋腐食抑制材)

$$A = 12.955 \text{ m}^2$$

(3) 含浸材 (シラン系鉄筋腐食抑制材)

$$v1 = 12.955 \times 0.60 \text{ l/m}^2$$

標準使用量

$$v2 = 7.773 \times 0.10 \text{ l}$$

ロス率10%

$$\sum W = 8.550 \text{ l}$$

2.3.2 表面保護工數量計算書

2.4 目地部充填工

2.4.1 下地処理 (遊間部清掃)

$$L = 0.400 + 1.625 + 1.863 + 0.275 = 4.163 \text{ m}$$

2.4.2 目地材充填 (ゴム状高弹性目地材)

(1) $t_1, t_3 (10 \times 20 \text{mm})$

(t_1)

$$L_1 = 0.400 = 0.400 \text{ m}$$

(t_3)

$$L_2 = 1.863 = 1.863 \text{ m}$$

$$\sum L_1 = 2.263 \text{ m}$$

$$V = \frac{(長さ) \times (幅) \times (深さ)}{\times 1.4 \times 1.20} \times 1000 \text{ kg/t}$$

単位体積重量 ロス率20% $= 0.760 \text{ kg}$

(2) $t_2 (35 \times 35 \text{mm})$

$$L_1 = 1.625 = 1.625 \text{ m}$$

$$\sum L_1 = 1.625 \text{ m}$$

$$V = \frac{(長さ) \times (幅) \times (深さ)}{\times 1.4 \times 1.20} \times 1000 \text{ kg/t}$$

単位体積重量 ロス率20% $= 3.344 \text{ kg}$

(3)

$t_4 (10 \times 25 \text{mm})$

$$L_1 = 0.275 = 0.275 \text{ m}$$

$$\sum L_1 = 0.275 \text{ m}$$

$$V = \frac{(長さ) \times (幅) \times (深さ)}{\times 1.4 \times 1.20} \times 1000 \text{ kg/t}$$

単位体積重量 ロス率20% $= 0.116 \text{ kg}$

2.4.3 コンクリートはつり

(1) コンクリートはつり

$$(t1) \quad \text{(幅)} \quad \text{(幅)} \quad \text{(長さ)} \\ A1 = (0.004 + 0.004) \times 0.400 = 0.0032 \text{ m}^2$$

$$(t2) \quad \text{(幅)} \quad \text{(幅)} \quad \text{(長さ)} \\ A2 = (0.014 + 0.019) \times 1.625 = 0.0536 \text{ m}^2$$

$$(t3) \quad \text{(幅)} \quad \text{(幅)} \quad \text{(長さ)} \\ A3 = (0.004 + 0.004) \times 1.863 = 0.0149 \text{ m}^2$$

$$(t4) \quad \text{(幅)} \quad \text{(幅)} \quad \text{(長さ)} \\ A4 = (0.004 + 0.004) \times 0.275 = 0.0022 \text{ m}^2$$
$$\sum A = 0.0739 \text{ m}^2$$

2.5 水切り工

2.5.1 後付け型水切り材 (EPDM系ゴム製水切り材 W25×H20mm)

$$\text{下流側} \quad \text{上流側}$$
$$L = 1.510 + 1.300 = 2.810 \text{ m}$$

2.5.2 下地処理

$$A = 2.810 \times 0.025 = 0.070 \text{ m}^2$$

2.5.3 接着剤塗布 (エボキシ樹脂系接着剤)

$$A = 2.810 \times 0.025 = 0.070 \text{ m}^2$$

2.6 視線誘導標設置工

2.6.1 視線誘導標設置

N = 2 = 2 本

2.7 構造物撤去工

2.7.1 橋梁付属物撤去工

(1) 視線誘導標撤去

視線誘導標（コンクリート建込）

N = 1 本

2.8 運搬処理工

2.8.1 膜運搬

(1) コンクリート構造物（無筋） 人力積込

1) 断面修復工（左官工法）

$$V1 = 0.117 \quad = 0.117 \text{ m}^3$$

2) 目地充填工（コンクリートはつり）

$$(t1) \quad \begin{array}{l} (\text{幅}) \\ V1 = 0.004 \times 0.020 / 2 \times 2 \times 0.400 \end{array} = 0.00003 \text{ m}^3$$

$$(t2) \quad \begin{array}{l} (\text{幅}) \\ V2 = (0.014 + 0.019) \times 0.035 / 2 \times 1.625 \end{array} = 0.00094 \text{ m}^3$$

$$(t3) \quad \begin{array}{l} (\text{幅}) \\ V3 = 0.004 \times 0.020 / 2 \times 2 \times 1.863 \end{array} = 0.00015 \text{ m}^3$$

$$(t4) \quad \begin{array}{l} (\text{幅}) \\ V4 = 0.004 \times 0.025 / 2 \times 2 \times 0.275 \end{array} = 0.00003 \text{ m}^3$$

$$\sum V = 0.00115 \text{ m}^3$$

$$V = 0.117 + 0.00115 \quad = 0.11815 \text{ m}^3$$

2.8.2 膜処分（がれき類）

$$V = 0.117 + 0.00115 \quad = 0.11815 \text{ m}^3$$

$$W = 0.11815 \times 2.35t \quad = 0.27765 t$$

2.9 交通整理工

2.9.1 交通整理員

(1) 交通整理員B 1式 = 6人
